

Platánfa-sor gallyazása az Építők útján 2014. tavasz


A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt héten 2014. április 9-én és 10-én fagallyazási munkákat végzett a Tiszaújváros, Építők útja 1-5. és 2-6. szám közötti útszakaszon lévő platánfákon.


A munkálatok elvégzését számos egyeztetés, favizsgálat, különböző szempontok kiértékelése, a lakók igényeinek, kéréseinek figyelembe vétele előzte meg.

A gallyazási munkák elvégzését egyrészt az indokolta, hogy a Tiszaújváros Építők útja 1-5. és 2-6. számú épületeknél elhelyezkedő fasor, - ami többségében platánokból áll - az épülethez túl közel lett ültetve, s így nem lett biztosítva a fák számára a megfelelő élettér. A fák a rendelkezésükre álló kis életteret már teljesen kitöltik, elérik a házak falait, - melyet akár meg is rongálhatnak-, ill. akadályozzák a lakásokba a napfény bejutását. Az ott élő lakosok egy része is ilyen problémákkal kereste meg Tiszaújváros Önkormányzatát és a Városgazda Kft.-t, tehát ezek a tényezők már zavarták az ott élőket, emiatt a lakók egy része szeretne volna a fák eltávolítását, kivágását.

Másrészt viszont nagyon fontos szempontot kellett szem előtt tartani, hogy az utcában közlekedő, nemcsak a közvetlenül a fák közelében élő emberek a túlkoros fák által nyújtott esztétikai élmény rabjai, hiszen naponta gyönyörködhetnek a csodálatos fasorokban, ők a végtelékig ragaszkodnak a platánfákhoz

A fák vizsgálatát szemrevételezéssel és Fakopp műszeres vizsgálattal végeztük el. A fák szemrevételezésénél pár darab kisebb odút és néhány felületi sérülést találtunk. Megállapítottuk, hogy az Építők útja 1-5. előtt a fák a ház falától 4 méterre, az Építők útja 2-6. mögött a ház falától 3,5 méterre vannak ültetve. A sérült fákon végzett Fakopp műszeres vizsgálat néhány százalékos korhadást jelzett az egyes fák törzsén, ami alapján a fák törzse biztonságosnak tekinthető, a kivágását nem indokolja, ezért mi sem javasoltuk a fák kivágását, hanem csak a fák épület felé eső oldalainak felgallyazását az épületek teljes magasságában.

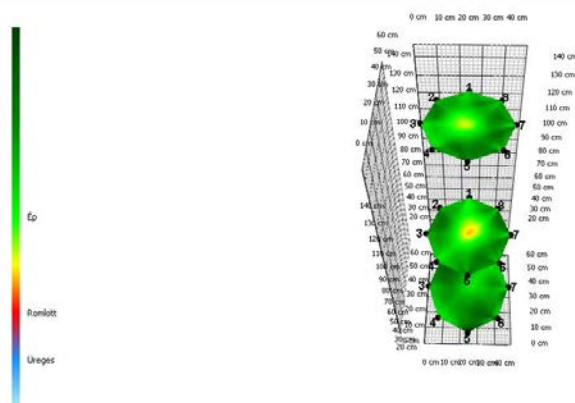

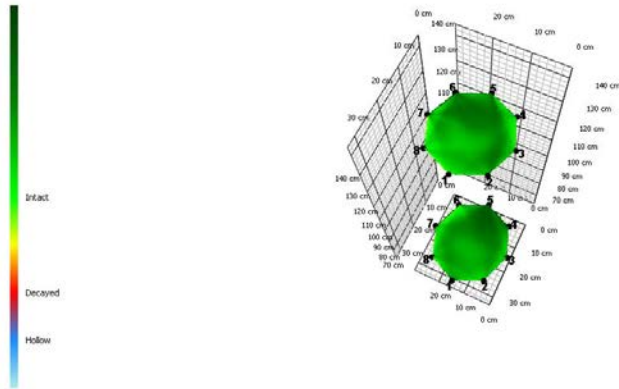

A gallyazást alvállalkozó bevonásával kosaras gépjárműből végeztük el. A friss sebzési felületeket sebkezelésben részesítettük. A munkálatokat az ott élők folyamatosan figyelemmel kísérték.



A munkák befejeztével a fák házak felőli oldala teljesen fel lett gallyazva, így szellősebbé vált az ablakok előtti tér, jobb lett a lakások benapozása, amivel remélhetőleg elégedettek lesznek a közvetlenül a fák szomszédságában élők.

Tiszaújváros, 2014. április 18.

Készítette:

Sávolyi Péter
részlegvezető
